



**Construtora LDN Ltda.**

---

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## 1ª MEDIÇÃO

**NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023**

**Ref.: Medição do Tribunal Regional  
Federal da 1ª Região**



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELLOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-

Insc. CNPJ 24.916.280/0001-40

CF/DF 07.320.197/001-08

FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047



MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.4.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	M <sup>2</sup>	1.513,13	1.210,50

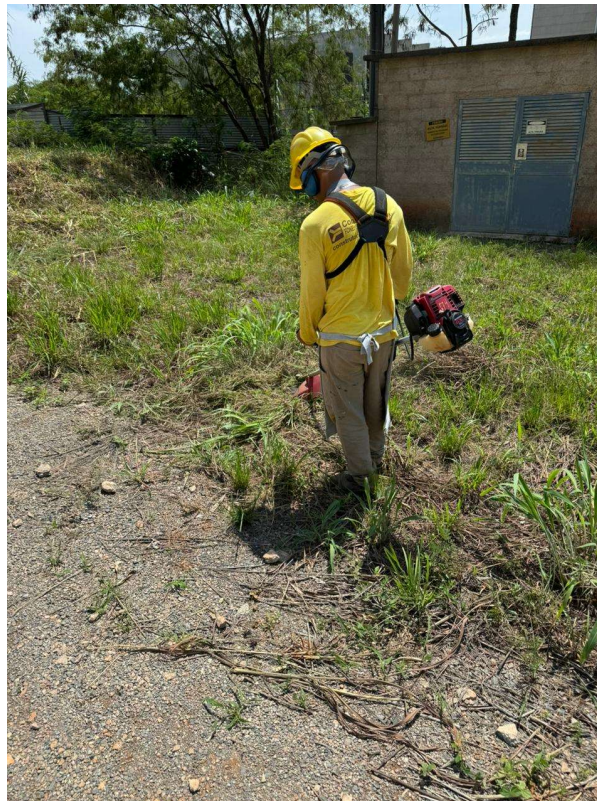


Foto 1 – Limpeza de camada vegetal.





# Construtora LDN Ltda.

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.1	Placa da obra	M <sup>2</sup>	8,00	8,00



Foto 2 – Placa da obra.



SEPN Q. 504 BLOCO "C" Nº 31 SOBRELOJA 60 – BRASÍLIA-DF CEP 70.730-

Insc. CNPJ 24.916.280/0001-40

CF/DF 07.320.197/001-08

FONE: (61) 3326-8882 e (63) 3215-8175 FAX: (61) 3326-1063 e (63) 3215-4047



MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.2	Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.	M <sup>2</sup>	98,24	33,00



Foto 3 – Escritório.





MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, inclusos prateleiras.	M <sup>2</sup>	54,06	24,34



Foto 4 – Almoxarifado.

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.4	Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.	M <sup>2</sup>	104,71	46,11



Foto 5 – Almoxarifado.





MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário.	M <sup>2</sup>	82,16	43,27



Foto 6 – Almoxarifado.

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.6	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira.	UN	2,00	1,60



Foto 7 – Reservatorio elevado.





MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos	M <sup>2</sup>	69,19	17,98



Foto 8 – Central de armadura.

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.8	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	M <sup>2</sup>	51,06	18,31



Foto 9 – Central de forma.





CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.9	execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	M <sup>2</sup>	11,36	9,09



Foto 10 –Guarita.

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.5.11	Tapume com telha metálica.	M <sup>2</sup>	627,67	502,14



Foto 11 –Tapume metalico.







CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QNT. CONTRATO	QNT. MEDIÇÃO
2.7.1	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m <sup>3</sup> / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3)	M <sup>2</sup>	4.204,72	3.784,25



Foto 12 – Tapume metálico.

