



PROCESSO Nº. 249/2011- TRF

DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 098/2010 – TRF1
PARA: DIENG

Assunto: Encaminha 3ª medição contrato, referente aos serviços do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 098/2010-TRF1

Senhor Diretor,

Encaminhamos a medição abaixo descrita e seus respectivos documentos, para procedimentos de conferência e pagamento.

3ª MEDIÇÃO CONTRATO (SERVIÇOS DO 1º TA):

O valor executado referente à 3ª medição é de R\$ 946.418,45 (novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos). Desse valor podemos inferir os seguintes dados:

- A Contratada executou, nesse período, o equivalente a 0,90% do valor global do contrato original. Considerando-se o cronograma físico-financeiro vigente estava previsto para o período a execução de R\$708.300,80, o equivalente a 0,67%. Verificou-se execução a maior de R\$ 238.117,65, o equivalente a 0,25% a mais do previsto;
- A Contratada executou cumulativamente, do início dos serviços até 31 de março de 2011, R\$1.385.191,26, ou 1,32% do valor do contrato original, quando o previsto indicava execução de R\$1.269.648,82 , ou 1,21%, refletindo um incremento de produção da ordem de 0,11% em relação ao previsto no cronograma físico-financeiro vigente.
- O IDP (Índice de Desempenho da Produção) para o mês foi de 1,09 (um inteiro e nove centésimos). Significa que, mantendo-se esta tendência, o prazo para o término da obra seria de 742,44 dias, ao invés dos 810 dias previstos no contrato,



o que adiantaria o prazo contratual para a conclusão dos serviços. O adiantamento acumulado é de 8 dias verificado até 31 de março de 2011;

- Confrontação gráfica dos serviços previstos x serviços executados:

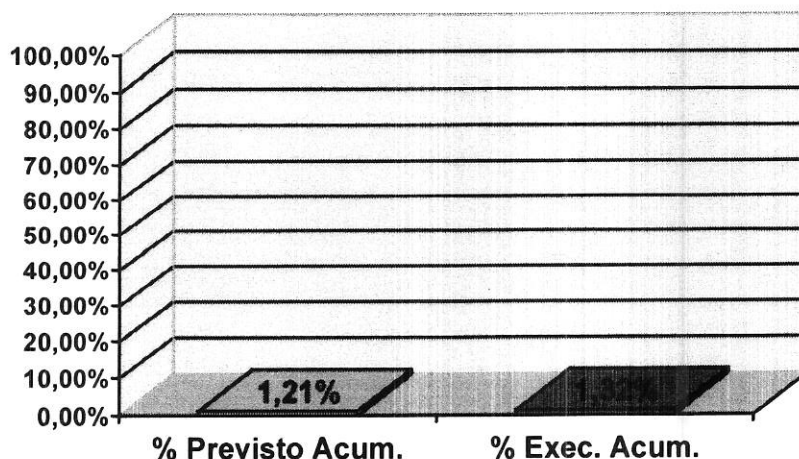


Figura 1 – Gráfico percentual “previsto x executado”.

- Cabe ressaltar que, nesta medição, a Contratada executou essencialmente os serviços caracterizados no 1º Termo Aditivo.

Os documentos entregues pela Contratada são:

1. Ofício – 036/11, que encaminha o Boletim e a seguinte documentação para pagamento da 3ª medição:
 - a. Nota Fiscal de Serviços nº. 279, no valor de R\$ 946.418,45 de 05/05/2011;
 - b. Planilha detalhada desta 3ª medição;
 - c. Protocolo de envio de arquivos – conectividade social da CEF;
 - d. CRF – Certificado de Regularidade da Situação do FGTS, com validade no período de 12/04/2011 a 11/05/2011;
 - e. Protocolo de envio de arquivos – conectividade social da CEF;
 - f. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, com validade até 14/08/2011;
 - g. Guia da Previdência Social - GPS – competência: 02/2011;



- h. GRF / GFIP (FGTS) competência: 03/2011;
- i. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, com validade até 27/09/2011;
- j. Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS (Tomador) – competência: 03/2011;
- k. Relação de Tomador/Obra – RET – 05/04/2011;
- l. Relação de trabalhadores constante no arquivo SEFIP – MTE, competência: 03/2011 (pág.0019/0022 e 0199/0240 a 0225/0240);
- m. Folha de pagamento do mês (pág.0001 a 0075) – ref.: 03/2011;
- n. Cópias das notas fiscais de remessa dos materiais aplicados nos serviços objeto deste contrato (ref. março de 2011);

Destacamos que o Alvará de Construção, embora exigido para o pagamento da 1ª medição, não está mais sendo tratado na esfera de competência desta Comissão de Fiscalização.


Os documentos entregues pela Contratada estão de acordo com as exigências de apresentação, elencados na Cláusula Décima Segunda do Contrato.

Solicitamos o encaminhamento desses documentos à SECAD, para análise e aprovação, visando o regular pagamento.

Brasília, 13 de maio de 2011.


Rony Figueredo Corrêa
Comissão de Fiscalização
Coordenador


Luciano Lopes de Paula
Comissão de Fiscalização
Membro

RECEBIDO NA DIENG
Em 13/05/11
Ass. [Assinatura] h. Ass. [Assinatura]
A SECAD
PARA SPERAR ANTE
OUTER VARIAS O DESEMPENHO
Foi 10/05/2011

Mauricio P. Rubo
Divisão de Engenharia e Manutenção
Diretor
Comissão de Fiscalização
Membro
